

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

12684

MVZ. JORGE MAKSABEDIAN DE LA ROQUETTE
DIRECTOR GENERAL DE VIDA SILVESTRE

P R E S E N T E

NUMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 09 de Mayo de 2016

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

LUGAR: Durango, Dgo.

PERIODO: 06 de Mayo de 2016


a) OBJETO DE LA COMISIÓN

Dar seguimiento al proyecto apoyado con Recursos de SEMARNAT, del PEF-2015, denominado: **"Infraestructura y Equipamiento para el Manejo y Exhibición de Fauna Silvestre Nativa en el Zoológico Sahuatoba"**. Dadas las inconsistencias detectadas en la información presentada en el informe físico y financiero de diciembre de 2015, en cuanto a las avances físicos del proyecto y la falta de informes de seguimiento del Gobierno del estado de Durango.

b) RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Siendo las 12:00 horas del viernes 06 de mayo de 2016, reunidos los representantes del Gobierno del estado de Durango, a través de la **Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA)**; así como, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la **Dirección General de Vida Silvestre (DGVS)** y la Delegación Federal de SEMARNAT, en el estado de Durango, se llevó a cabo la **1er. reunión de trabajo técnico**, para dar seguimiento al anexo técnico y Convenio Específico de Coordinación para la ejecución del proyecto en comento apoyado con recursos de SEMARNAT, del **Presupuesto Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2015**, de acuerdo a la Orden del Día.

CONCLUSIONES y d) RESULTADOS OBTENIDOS



MINUTA

Durango, Dgo. a Viernes 06 de Mayo de 2016.

1er. REUNION DE TRABAJO TÉCNICO

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO TÉCNICO Y DEL
CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO APOYADO CON RECURSOS DE
SEMARNAT, DEL PEF-2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

Asunto: Seguimiento a la ejecución del proyecto apoyado con recursos de SEMARNAT, del PEF-2015.
Lugar: Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Av. Ferrocarril 109, Anexo Vivero Sahuatoba
Zoológico de Sahuatoba Blvd. Guadalupe SN Fracc. Lomas del Parque, Carretera Durango-
Matamoros.

OBJETIVO: Dar seguimiento al cumplimiento del anexo técnico del proyecto denominado
• **Infraestructura y Equipamiento para el Manejo y Exhibición de Fauna Silvestre Nativa en el Zoológico Sahuatoba**

ORDEN DEL DÍA

Horario	Temas	Participantes
12:00 - 12:10	• Bienvenida	
12:10 a 13:00	• Recorrido en el sitio del proyecto - "Zoológico Sahuatoba"	Gobierno del estado de Durango Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA)
	• Situación Actual del Proyecto	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
13:00 a 15:15	• Asuntos Generales	Dirección General de Vida Silvestre (DGVS)
	• Acuerdos y Firma de Minuta	Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Durango

Breve relatoria.

Siendo las 12:00 horas, reunidos los representantes del Gobierno del estado de Durango, a través de la **Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA)**; así como, de la **Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)**, a través de la **Dirección General de Vida Silvestre (DGVS)** y la **Delegación Federal de SEMARNAT** en el estado de Durango (*ver lista de asistencia al final*), se llevó a cabo la **1er. reunión de trabajo técnico**, para dar seguimiento al anexo técnico y Convenio Específico de Coordinación para la ejecución del proyecto apoyado con recursos de **SEMARNAT**, del Presupuesto Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2015, denominado:




"Infraestructura y Equipamiento para el Manejo y Exhibición de Fauna Silvestre Nativa en el Zoológico Sahuatoba"

De acuerdo a la Orden del Día.

RECORRIDO EN EL SITIO DEL PROYECTO – "ZOOLOGICO SAHUATOBA"



No. 1 de Nueva España, P.O. Box 14, C. A. México, D.F. y en Alameda Central, C.P. 06000, México, D.F.

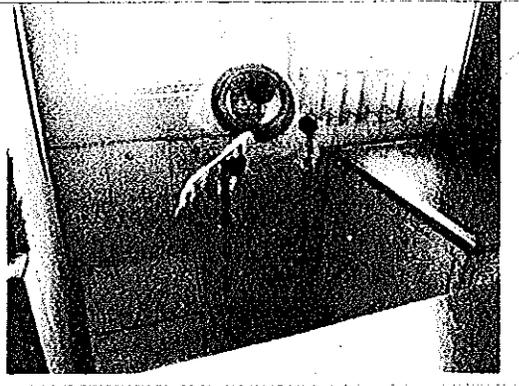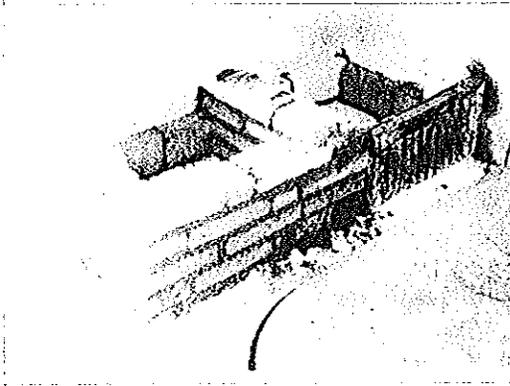

Atención Nacional No. 120-10-1234 - Vigencia: Dirección Municipal de Educación Pública Municipal

Página 3 de 10



SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

Antecedentes:

- Oficio de validación del anexo técnico.- No. SGPA/DGVS/10292/15, de fecha 24 de septiembre de 2015.
- Monto total de aportación federal: \$4,500,000.00 (Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.).
- Contrato de Obra Núm. OP 007/2015, de fecha 05 de noviembre de 2015.
Monto: \$4,438,298.89
Vigencia: 05 de noviembre de 2015 al 31 de diciembre de 2015.
- Factura A-20, de fecha 15/11/2015, por concepto de anticipo, por un importe de: \$1,331,489.60
- Contrato de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios, CONTRATO ADQ. 021/2015, de fecha 28 de noviembre de 2015, Vigencia: inicio 30 de noviembre de 2015, fecha de entrega: 30 de diciembre de 2015.
Monto: \$99,800.60

Anexo Técnico:

Resumen del presupuesto.

OBRA: REMODELACIÓN DE ZOOLOGICO
 UBICACION: ZOOLOGICO SAHUATOBA

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	ZOOLOGICO		1.00	\$ 3'879,310.35		
	ADQUISICIONES		1.00	\$ 62,739.31	\$	62,739.31
	ALBERGUE PARA CANIS LATRANS (COYOTE)		1.00	\$ 819,152.41	\$	819,152.41
	ALBERGUE PARA DKOOTYLES TAJACU (PEGARI DE COLLA)		1.00	\$ 617,123.69	\$	617,123.69
	ALBERGUE PARA PROCYON LOTOR (MAPACHE)		1.00	\$ 622,536.63	\$	622,536.63
	ALBERGUE PARA UROCYON CINEREOARGENTEUS (ZORRO GRIS)		1.00	\$ 618,162.38	\$	618,162.38
	ALBERGUE PARA NASUA NARICA (COATI DE NARIZ BLANCA)		1.00	\$ 680,108.97	\$	680,108.97
	AREA DE ANDADOR PEATONAL		1.00	\$ 455,486.96	\$	455,486.96
	Total de ZOOLOGICO		1.00	\$ 3'879,310.35	\$	3'879,310.35
	** TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				\$	3'879,310.35
	** TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 35/100 M.N. **					
				Impuesto	\$	\$20,659.65
				Total	\$	4'500,000.00

** CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. **

ADQUISICIONES:

Descripción	Monto (incluye IVA)
• Suministro de <u>dos</u> mesas de trabajo en acero inoxidable para la preparación de los alimentos suministrados a las especies, con las características técnicas siguientes: Modelo T-304...	\$32,433.60
• Un paquete de juego consultorio veterinario que servirá para el tratamiento de animales enfermos, control de enfermedades y servicios preventivos, consta de: una vitrina, mesa de exploración, un gabinete, un bote-banco para basura, una lámpara de chicote y un porta suero	\$8,004.00
• Refrigerador marca Torrey, modelo R-36-2, dos puertas de cristal, seis parrillas ajustables...	\$23,989.99
• Congelador para almacenar alimentos... horizontal tapa cofre, capacidad de 25 pies cúbicos, capacidad de 708 litros, marca Torrey, modelo CHTC-24.	\$12,990.00

	Subtotal:	\$77,417.60
Obra – albergues (incluye área de manejo) y andador		\$4,422,582.40
	Total	\$4,500,000.00

Descripción	Monto
Adquisiciones Contrato ADQ. 021/2015	\$99,800.60
Adquisiciones Anexo Técnico	\$77,417.59
Diferencia	\$22,383.01
Obra albergues Contrato OP 007/2015	\$4,438,298.90
Obra albergues Anexo Técnico	\$4,422,582.40
Diferencia	\$15,716.50

DIFERENCIAS QUE FUERON CUBIERTAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

- Último oficio generado por la Unidad Responsable (UR):
 - Oficio No. SGPA/DGVS/03542/16, de fecha 13 de abril de 2016:
- En seguimiento a los Oficios No. SGPA/DGVS/02124/16, de fecha 03 de marzo de 2016 y No. SGPA/DGVS/00657/16, de fecha 02 febrero de 2016, medio por el cual se atendió el Oficio No. SP/130.3/081, de fecha 17 de diciembre de 2015 (Folio: DGVS/2015-0002215), en el que se remitió a esta Dirección General, el informe físico y financiero del mes de octubre y noviembre de 2015.

Se solicita atentamente lo siguiente:

- Informe físico y financiero del mes de diciembre de 2015 y documentación anexa correspondiente (comprobación total del gasto, estado de cuenta bancaria, memoria fotográfica y acta de entrega recepción de la obra).
- Respecto al Contrato de OP 007/2015, en la Declaración Segunda, en su fracción 11.6, numeral 9, habla acerca de que "El Contratista", conoce el contenido de la "Relación de los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso proporcione la contratante y su programa de utilización..." por lo que se solicitan los Términos de Referencia, Catálogo de conceptos del contrato y la relación de dichos materiales y equipos, a fin contar con mayor información técnica al respecto para su revisión.

Cabe señalar que en la Cláusula Quinta, se hace mención de que se "otorgará anticipo por el 20% de la asignación aprobada, para la compra de equipo y materiales de instalación permanente necesarios para la realización de los trabajos objeto de este contrato..."

- Informe físico y financiero del periodo enero, febrero y marzo de 2016 y documentación anexa correspondiente (comprobación total del gasto, estado de cuenta bancaria, memoria fotográfica y acta de entrega recepción de la obra).
- Entregar un informe final de la ejecución del proyecto de acuerdo al Anexo Técnico (un tanto en impreso –de ser posible por ambas caras de papel- y cuatro tantos en formato electrónico) y sus anexos:
 - Planos y mapas definitivos.
 - Memoria Fotográfica (en orden cronológico y con pie de foto).
 - Videos.
 - Bitácora (s).
 - Formatos de campo (Reportes de Supervisión de Obra, otros).
- Una vez concluido el proyecto, elaborar y remitir, debidamente suscrita, una **carta-finiquito**, acompañada de la documentación soporte que la respalde, conforme a lo señalado en el Anexo Técnico respectivo.
- **Comentarios/Compromisos del “Seguimiento y Control de los Proyectos Apoyados con Recursos del Ramo 16, Anexo 31, del PEF-2015 y Programas Normales” por parte de la Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Durango, de fecha 06 de abril de 2016:**

“SRNyMA comentó que han tenido problemas de coordinación dado que hay 3 dependencias municipales involucradas que son: La Dirección Municipal de Obras Públicas, la Dirección de Servicios Públicos y el Organismo Operador de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado; señalaron que la dependencia responsable (Aguas del Municipio de Durango) no ha solucionado la fuga de aguas negras que se registró casi desde el principio de los trabajos que estaban a cargo de la Dirección de Obras Públicas, en tanto que ésta no destina el equipo necesario para resolver la situación y poder avanzar con las obras.

El titular de la SRNyMA se comprometió a hacer las gestiones necesarias para concluir en la primera semana de mayo.”

SE ENVÍA POR CORREO ELECTRÓNICO POR LA SRNyMA, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2016:

- Acta de Entrega-Recepción, Obra por Contrato OP 007/2015, de fecha 30 de enero de 2016.
 - Monto Contratado: \$4,438,298.90; del cual recurso federal: \$4,422,582.40 y estatal: \$15,716.80

Nombre

Cargo/Institución

Correo electrónico

Firma

Antonio...	
...	
...	

e) CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE

Dar seguimiento al Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento a la ejecución del proyecto apoyado con recursos de SEMARNAT, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al Anexo Técnico validado; a fin que el financiamiento otorgado se sujete a los criterios de objetividad, eficacia y eficiencia, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, y que se apliquen efectivamente a los fines para los cuales fueron otorgados.

ATENTAMENTE

BIOL. JUAN PABLO DAVILA SOTELO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.
