

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

MVZ. JORGE MAKSABEDIAN DE LA ROQUETTE
DIRECTOR GENERAL DE VIDA SILVESTRE

P R E S E N T E

NUMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 30 de Marzo de 2016

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

LUGAR: Tijuana, Baja California

PERIODO: 29 de Marzo de 2016

a) OBJETO DE LA COMISIÓN

Dar seguimiento al proyecto apoyado con Recursos de SEMARNAT, del PEF-2015, denominado: "Ampliación de UMA de Reproducción y Crianza de Totoaba". Dadas las inconsistencias detectadas en la información presentada en el informe físico y financiero del periodo de octubre a diciembre de 2015, respecto al Anexo Técnico y Adendum al Anexo Técnico correspondiente (por un monto preliminar de \$4,622,278.88).

b) RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Con objeto de optimar los tiempos y dar mejor seguimiento al proyecto la reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), sede en la que se realizó la 1er. Reunión de Trabajo Técnico, en seguimiento al proyectos, apoyado con recursos de SEMARNAT, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2015, denominado: "Ampliación de UMA de Reproducción y Crianza de Totoaba".

CONCLUSIONES y d) RESULTADOS OBTENIDOS

MINUTA

Ensenada, Baja California, a Martes 29 de Marzo de 2016.

1er REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO
PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
APOYADO CON RECURSOS DE SEMARNAT, DEL PEF-2015, DENOMINADO:

"AMPLIACIÓN DE UMA DE REPRODUCCIÓN Y CRIANZA DE TOTOABA"

Sede: Carretera transpeninsular Ensenada-Tijuana #3917 Col. Playitas C.P. 22800; Departamento de Servicios Administrativos planta baja Vicerrectoría Ensenada, Baja California.

Referencia: Oficio No. SGPA/DGVS-02714/16, de fecha 17 de marzo de 2016.

OBJETIVO: Dar seguimiento al cumplimiento del Adendum al Anexo Técnico, Anexo Técnico y Convenio Específico de Coordinación para la ejecución del proyecto denominado:

"Ampliación de UMA de Reproducción y Crianza de Totoaba"

ORDEN DEL DÍA

HORARIO	TEMAS	PARTICIPANTES
11:30 - 11:45	Bienvenida	Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), Gobierno del estado de Baja California
	Situación Actual del Proyecto	
11:45 - 12:20	Recorrido en el sitio del proyecto	Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
12:20 - 12:30	Receso	
12:30 - 13:30	Revisión de la información presentada.	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
13:30 - 13:40	Asuntos Generales	Dirección General de Vida Silvestre (DGVS)
13:40 - 13:50	Acuerdos	Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Baja California

Breve relatoria.

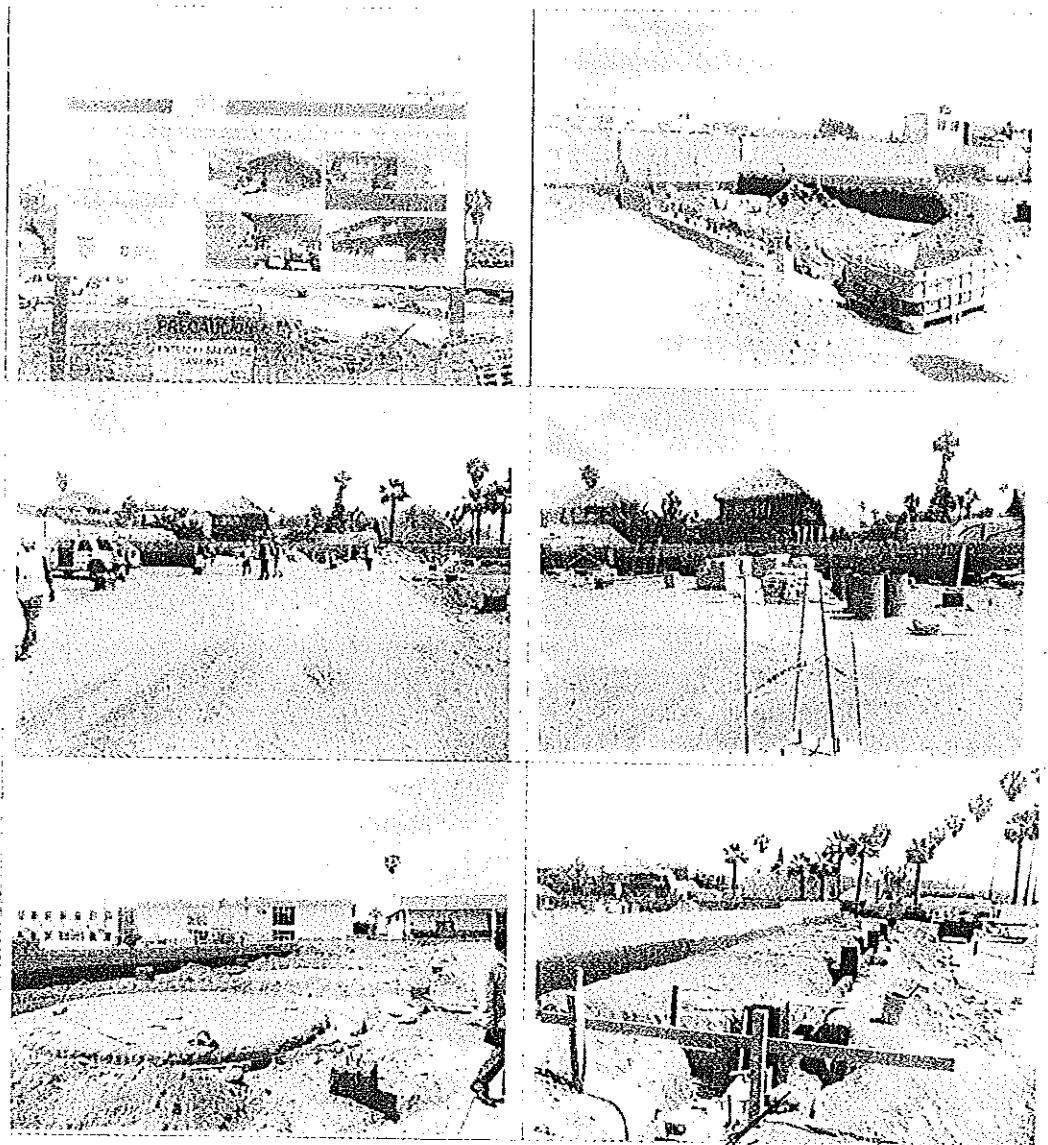
Siendo las 11:30 horas, reunidos los representantes del Gobierno del estado de Baja California, a través de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); así como, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) y de la Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Baja California (ver lista de asistencia anexa), se llevó a cabo la reunión de trabajo técnico, para dar seguimiento al Adendum al Anexo Técnico, Anexo Técnico y Convenio Específico de Coordinación para la ejecución del proyecto denominado:

"Ampliación de UMA de Reproducción y Crianza de Totoaba"

ANTECEDENTES:

1. ANEXO TÉCNICO VALIDADO - OFC. SGPA/DGVS/11596/15, de fecha 19 de Octubre de 2015.
2. VALIDACIÓN DE ADENDUM AL ANEXO TÉCNICO VALIDADO - OFC. SGPA/DGVS/15183/15, de fecha 15 de Diciembre de 2015
3. RECURSO FEDERAL MINISTRADO:
\$19,829,681.00
4. CONTRATO No. ENS-O-RF-022-2015, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2015, VIGENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2016, MONTO: \$15,207,402.12
5. SE ENTREGA COPIA DE LA FACTURA No. 704, POR UN IMPORTE DE \$4,562,220.63 PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% AL CONTRATISTA; DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015.

RECORRIDO EN EL SITIO DEL PROYECTO:



→ REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA

Requerimientos solicitados por la Unidad Responsable (mediante Oficio Núm. SGPA/DGVS/02123/16, de fecha 03 de marzo de 2016):

- Presentar el informe de avance físico y financiero del periodo de octubre a diciembre de 2015, debidamente requisitado, y que deberá incluir lo siguiente:
 - Sección 2.- Reporte de recursos ejercidos y reporte de rendimientos generados.
 - Sección 3.- Reporte de empleos generados.
 - Sección 6.- El reporte debe estar validado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Baja California.
 - Copia de los estados de cuenta bancaria por mes (se deberá reportar la información de la apertura de cuenta bancaria productiva, de la Universidad Autónoma de Baja California, para la radicación de los recursos).
 - Copia del Convenio de Colaboración, firmado el día 13 de octubre de 2015, entre la Universidad Autónoma de Baja California y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California.
- Respecto al Contrato No. ENS-O-RF-022-2015, de fecha 14 de diciembre de 2015, se solicita presentar copia del anexo: 1. Catálogo de conceptos (que consta de 18 hojas), y 2. Programa de ejecución de obra y de erogaciones (que consta de 14 hojas).
- Del Convenio Adicional No. 01/01 al Contrato No. ENS-O-RF-022-2015, de fecha 15 de diciembre de 2015, se solicita copia del Dictamen Técnico de "La Contratante" que se declara; así como, de los anexos que sustituyen a los enunciados en la declaración II.5 (Cláusula Primera).
- Presentar el informe de avance físico y financiero del periodo de enero a febrero de 2016, anexando la documentación soporte correspondiente.

→ Requerimientos atendidos mediante Oficio Núm. SPA-MXL-0666/2016, de fecha 08 de marzo de 2016 (con Folio: DGVS/2016-0000155),

[illegible]

- Reporte Técnico de Avances (a Diciembre de 2015), del 20% global del proyecto (entregado mediante Oficio Núm. SPA-MXL-0059/2016, de fecha 11 de enero de 2016).
- Reporte Técnico de Avances (a Diciembre de 2015), del 5% global del proyecto (entregado mediante Oficio Núm. SPA-MXL-0668/2016, de fecha 08 de marzo de 2016).
- CONVENIO ADICIONAL No. 01/01 AL CONTRATO No. ENS-O-RF-022-2015; DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2015. INCREMENTO EN MONTO POR: \$4,822,273.00

MONTO CONTRATO + MONTO CONVENIO ADICIONAL = \$19,829,681.00

Firmas Contrato No. ENS-O-RF-022-2015:

Firmas CONVENIO ADICIONAL No. 01/01 AL CONTRATO No. ENS-O-RF-022-2015

(Falta firma de la UABC), Se presenta Convenio Adicional en original debidamente firmado.

- Dictamen Técnico para Convenio Adicional No. 1, de fecha 15 de diciembre de 2015.

Cuadro Comparativo:

	CONCEPTO	ANEXO TÉCNICO	AMPLIACIONES	ADENDUM AT	CATALOGO DE CONCEPTOS CONTRATO	
1	TERRACERIAS	\$655,253.87		\$655,253.87	\$365,003.13	
2	PRELIMINARES	\$5,697.90		\$5,697.90	\$6,946.61	
3	CIMENTACION	\$2,134,524.78		\$2,134,524.78	\$1,443,516.62	
4	FIRVES	\$361,545.38		\$361,545.38	\$371,485.62	
5	ESTRUCTURA	\$4,920,790.57	\$598,629.07	\$5,509,419.64	\$4,499,357.77	
6	MUROS		\$913,265.36	\$913,265.36	\$699,622.70	
7	CUBIERTA		\$2,793,425.51	\$2,793,425.51	\$2,043,638.50	
8	ACABADOS		\$100,304.97	\$100,304.97	\$527,010.31	
9	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	\$477,220.83	\$63,680.82	\$540,901.62	\$2,920,112.16	
10	TANQUES DE FIBRA DE VIDRIO		\$4,014,557.20	\$4,014,557.20	\$0.00	\$2,234,945.78
11	TRANSFORMADOR	\$55,656.50		\$55,656.50	\$33,076.00	
	SUBTOTAL	\$8,620,689.80	\$8,473,862.93	\$17,094,552.73	\$13,109,829.42	
	IVA	\$1,379,310.37	\$1,355,818.07	\$2,735,128.44	\$2,097,572.71	
	TOTAL	\$10,000,000.17	\$9,829,681.00	\$19,829,681.17	\$15,207,402.13	

Ampliación en volúmenes:

[illegible]

Derivada de la información presentada previamente y durante la reunión de la ejecución del proyecto tanto en aspectos técnicos, como administrativos y financieros, esta Dirección General ve reflejadas economías por un importe de \$4,622,278.88 (Cuatro Millones Seiscientos Veintidos Mil Doscientos Setenta y Ocho Pesos 88/100 M.N.). Ya que con el CONTRATO No. ENS-O-RF-022-2015, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2015, VIGENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE MARZO DE 2016, MONTO: \$15,207,402.12; se cubrían los alcances del proyecto en comento, de acuerdo al Adendum del Anexo Técnico.










ASUNTOS GENERALES.

- No hay asuntos que tratar por parte de la SPA, ni por parte de la UABC y de SEMARNAT

ACUERDOS:

Tema	Acciones	Responsable	Fecha de Entrega
"Ampliación de UMA de Reproducción y Crianza de Totoaba"	- Entrega de Informe de avance físico y financiero de enero a marzo de 2016, adjuntando copia de la documentación soporte correspondiente. - Copia del estado de cuenta bancaria de cada mes. - Memoria fotográfica	Secretaría de Protección al Ambiente (SPA)	15 de abril de 2016
	- Se presentará la justificación fundada y motivada, del uso del importe de \$4,622,278.88, que observa la Unidad Responsable	Universidad Autónoma de Baja California (UABC)	(A través de la Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Baja California).

SIENDO LAS 14:20 HORAS, DEL MARTES 29 DE MARZO DE 2016, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO.....

NOMBRE	FIRMA
Ricardo III LIGORRADA BENAVIDES Jefe Depto. Sect. Asistencial, UABC, EUSEMADA	
Conal David Trice FEM-UVBC Región de Protección de Vida	
Juan Guillermo Vaca Rodríguez Presidencia del Comité de Vigilancia	
Salvador Gómez Medina Jefe de Obras y Protección UABC	
MARISOL MIRANDA CASTILLO Deleg. SEMARAT B.C.	
Suemy Araya Salazar SUP-de OBRAS UABC	
Lizbet Pérez Gora Direc. Planeación y Pol. Ambiental SPA	
Sergio Calderín Claudio Director de Recursos Naturales de la SPA	
José Manuel Sánchez de la Cruz	José M. Sánchez
Luis Plana Félix García	
Juan Pablo Ibarra Soto	



LISTA DE ASISTENCIA

Ensenada, Baja California, a martes 29 de marzo de 2016.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO APOYADO CON RECURSOS DE SEMARNAT, DEL PEF-2015, DENOMINADO:

"AMPLIACIÓN DE UMA DE REPRODUCCIÓN Y CRIANZA DE TOTOABA"


SEMARNAT - SPA - UABC

Nombre	Organización/ Dependencia	Teléfono	Correo electrónico	Firma
Luz Plutarco Félix	SPA	560 2268	luzplutarcofelix@spa.gob.mx	
Luz Plutarco Félix	SPA	172 34 26	luzplutarcofelix@spa.gob.mx	
Juan Guillermo Vela Rodríguez	PAUTAL de Ensenada	646-175-07-07	direccion.tecn.enb@spa.gob.mx	
Salvador Gómez Méndez	CI. OCEANO	172 04 07	salvador.gomez@ci-oceano.gob.mx	
Stefany Araya Salazar	CI. OCEANO	Ext 65205	stefany.araya@ci-oceano.gob.mx	

e) CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE

Dar seguimiento al Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento a la ejecución del proyecto apoyado con recursos de SEMARNAT, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, de acuerdo al Anexo Técnico y Adendum al Anexo Técnico validados; a fin que el financiamiento otorgado se sujete a los criterios de objetividad, eficacia y eficiencia, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, y que se apliquen efectivamente a los fines para los cuales fueron otorgados.

ATENTAMENTE



BIOL. JUAN PABLO DAVILA SOTELO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PLANES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.
