





BITACORA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CON NO.TAB SAI MTT0 001 2020 CONSISTENTE EN EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO” CELEBRADO CON LA EMPRESA MORIELI SA DE CV.

DIAS 30 Y 31-OCTUBRE

SE HACE INICIO DE LABORES EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE EN LA DELEGACION FEDERAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEGÚN CONTRATO TAB SAI MTT0 001 2020 DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO.

RECEPCION DEL AREA A TRABAJAR (77.48 MTRS 2), CONSISTIO EN MEDIR, LIMPIAR Y ANALIZAR LOS DAÑOS PARA CORROBORAR LA ESTRATEGIA DE TRABAJO.

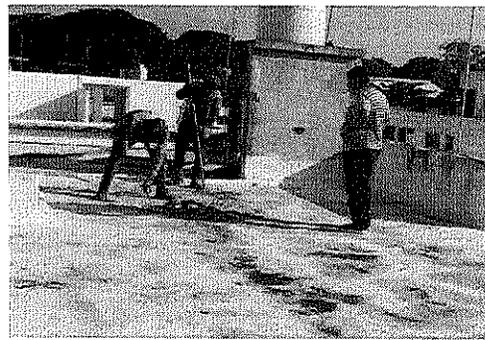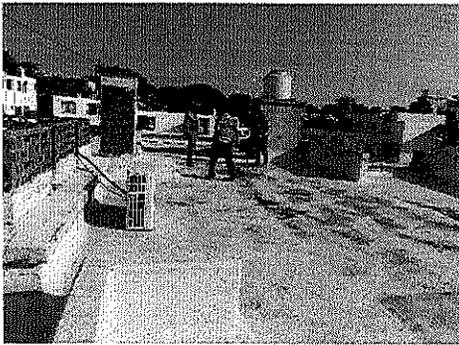

DIA DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE 2020

PICADO DE LOZA DAÑADA Y REVISIÓN Y UBICACIÓN DE BRETADURAS QUE PRESENTÓ LA LOZA AL MOMENTO DE LEVANTAR Y PICAR TODA EL AREA QUE SE ESTA TRABAJANDO.




7




DIA DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE 2020.

SE CONTINUÓ TRABAJANDO EN PICAR LOZA DAÑADA Y REVISIÓN Y UBICACIÓN DE BRETADURAS QUE PRESENTÓ LA LOZA AL MOMENTO DE LEVANTAR Y PICAR TODA EL AREA QUE SE ESTA TRABAJANDO

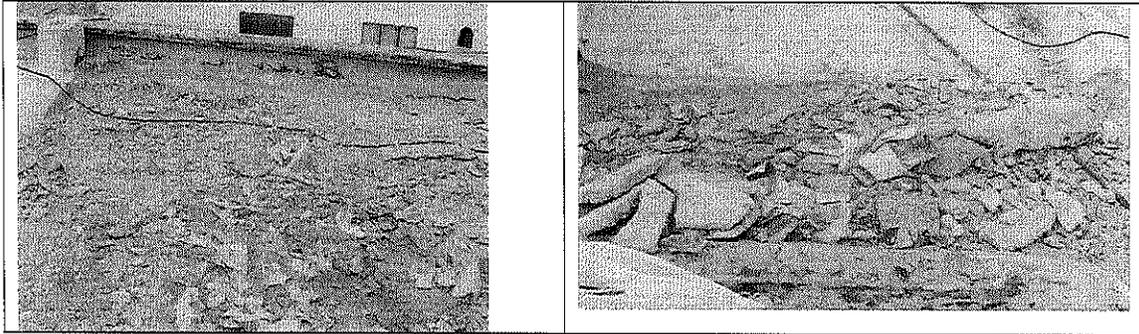

DIA DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020


LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO Y DEMAS MATERIALES DE LAS AREAS TRABAJADAS ASI COMO SU TRASLADO, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO.

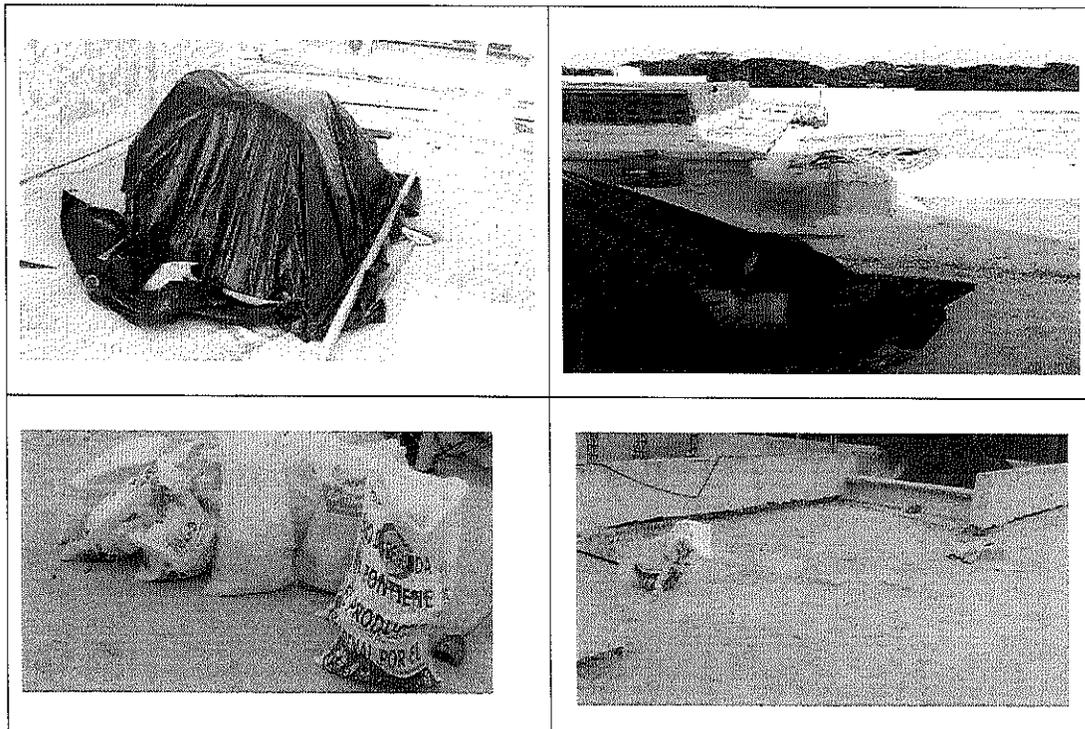

7


DIA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE

ELABORACIÓN, TENDIDO, PISONADO, MAESTREADO, NIVELADO, CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2:9 CON ESPESOR DE 4 CM. SELLADO CON LECHADA DE CEMENTO.

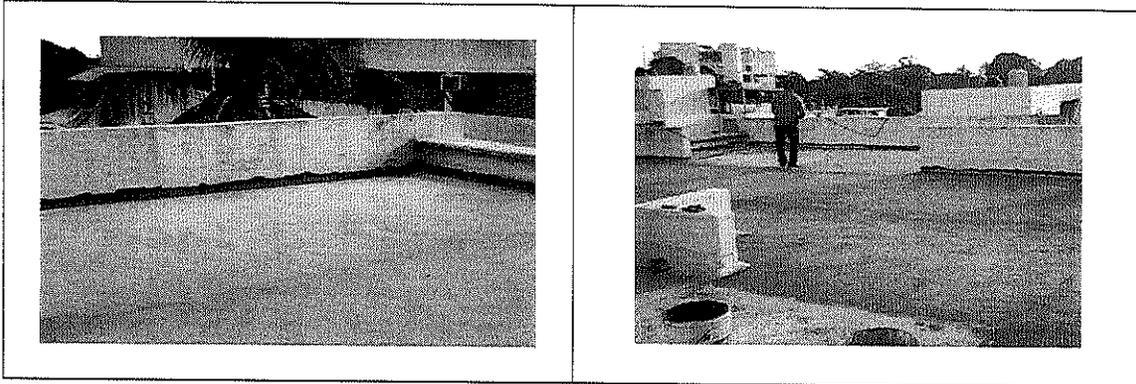

DIA 30 DE NOVIEMBRE

LIMPIEZA DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y ENTREGA RECEPCION.

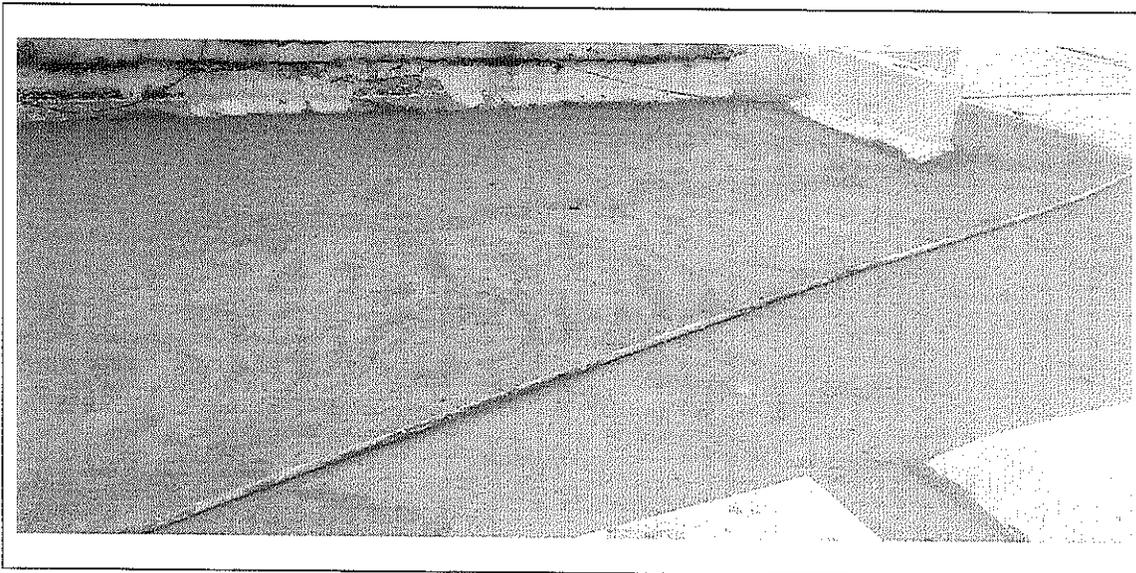



Delegación Federal de SEMARNAT
en el estado de Tabasco
Subdelegación de Administración
e Innovación.
ASUNTO: Finiquito
OFICIO: SEMARNAT/147/1103BIS/2020

Villahermosa, Tabasco a 30 de Noviembre del 2020.

C. Luis Enrique Hernández García
Morieli S.A de C.V
Representante Legal
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. En relación al contrato TAB SAI MTT0 001 2020 de fecha 30 de Octubre de 2020. Con la empresa **Morieli S.A de C.V.** Por un monto de \$ **72,175.00** (setenta y dos mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N) Para comunicar el cumplimiento conclusión del trabajo de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO"** en una superficie de **139.81 m2** de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Tabasco, el contrato de servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se procede a la elaboración del presente finiquito.

Una vez que los trabajos fueron recibidos a entera satisfacción y transcurrido el plazo de cumplimiento del contrato pactado, así mismo el presente sirve para informar que los trabajos fueron entregados por parte del contratista a l Delegación Federal en tabasco SEMARNAT.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.



LIC. LILIANA SAMBERINO MARIN
SUBDELEGADA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACION.

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA

NO.	NUMERO DE CONTRATO	TIPO DE OBRA	UBICACION DE LA OBRA	OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION	MONTO DEL CONTRATO	MONTO ESTIMADO A LA TERMINACION DE LA OBRA	FECHA DE TERMINACION ORIGINAL DE LOS TRABAJOS	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA OBRA
1	TAB SAJ MITTO 001 2020	CONSERVAR Y MANTENER	TABASCO		\$72,175.00	\$72,175.00	30 de Noviembre de 2020	30 de Noviembre de 2020	100%	100%

FUNDAMENTO: ARTICULO 29 FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Lic. Liliana Samberjro Marín

Subdelegada de Administración e Innovación.

Lic. Antonio Litona Cruz

Encargado de mantenimiento de Edificio

**ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE
SERVICIOS RELACIOADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NO.
TAB-SAI-MTTO-001-2020.**

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas del día **30 de noviembre de 2020**, se reunieron en las Oficinas de la Delegación Federal de la **SEMARNAT** en lo sucesivo "**SECRETARIA**", el **C. Francisco Rivera Hernández**, en su carácter de Encargado de Despacho de la **SEMARNAT** en el Estado de Tabasco, por otra parte la empresa "**Morieli S.A de C.V.**, y en calidad de Responsable de supervisión del servicio el **Lic. Antonio Licona Cruz**, Encargado de Mantenimiento de Edificio, con fundamento en lo establecido en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como 168 de su Reglamento, con el objeto de formalizar la recepción de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública, suscrito por la "**SECRETARIA**" y el **Luis Enrique Hernández García**, de conformidad a los siguientes

HECHOS.

PRIMERO.- Con fecha treinta de octubre de dos mil veinte, la "**SECRETARIA**" y el **C. Luis Enrique Hernández García**, celebraron el contrato de obra pública por el procedimiento de Adjudicación Directa a **TAB-SAI-MTTO-001-2020**, con el objeto de ejecutar los trabajos consistentes en Retiro sin recuperación. Medido previamente. Incluye: limpieza de área, carga y acarreo interior de escombros al banco de obra indicado por el instituto, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel de impermeabilizante existente y Mantenimiento en azotea, incluye; flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elevación, elaboración, tendido, apisonado, maestreado, nivelado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo con una superficie de 139.81 m², en Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Tabasco.

SEGUNDO.- "**SECRETARIA**" recibe del **C. Luis Enrique Hernández García** los trabajos consistentes en "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN LA DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO**", según presupuesto de obra de una superficie de 139.81m² presentado por el contratista, y que dicho presupuesto fue el precio más bajo en el procedimiento realizado en Villahermosa, Tabasco, a entera satisfacción de la "**SECRETARIA**".

TERCERO.- El monto total del presente contrato, es de \$ **62,219.82** (Sesenta y dos mil Doscientos diecinueve pesos 82/100 M.N.), más \$ **9,955.17** (Nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos 17/100 M.N.) haciendo un total con el Impuesto al Valor Agregado de \$ **72,175.00** (setenta y dos mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N)



CUARTO.- "El Contratista", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **22 días naturales**, en que se efectuarán los trabajos. El inicio de los trabajos se efectuará el día **30 de Octubre de 2020** y se concluirán a más tardar el día **30 de Noviembre de 2020**, de conformidad con el programa de ejecución pactado.

QUINTO.- Las estimaciones o Facturas a la fecha son estimación por un monto total de **\$ 72,175.00** (setenta y dos mil ciento setenta y cinco pesos 00/100 M.N), incluyendo IVA., no quedando ninguna estimación pendiente de autorización

MONTO CONTRATADO: \$72,175.00	ANTICIPO OTORGADO: \$0.00
MONTO EJERCIDO: \$72,175.00	ANTICIPO AMORTIZADO: \$0.00
MONTO CANCELADO: \$0.00	SALDO ANTICIPADO: \$0.00
AJUSTE DE COSTO: \$0.00	

SEXTO.- Las partes declaran que en el presente acto se entregan los trabajos contratados de los bienes instalados.

SEPTIMO.- El contratista hace entrega de los trabajos a la Subdelegación de Administración e Innovación, el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos.

NOVENO.- Después de un recorrido por la obra, revisados los trabajos y habiéndose constatado su ejecución de acuerdo con las especificaciones generales e indicaciones hechas, los representantes de la SEMARNAT, proceden a la recepción de los trabajos antes descritos.

CIERRE DEL ACTA.

Una vez cumplido el propósito de la formalización de la presente acta, no habiendo otro asunto que tratar se cierra la misma a las catorce horas del día 30 de Noviembre de dos mil veinte, firmando los asistentes en cada una de sus hojas de conformidad.

ENTREGA POR LA EMPRESA

Luis Enrique Hernández García.

Representante Legal.

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN OPERATIVA

Acta de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, que se lleva a cabo el día 30 de noviembre de 2020 a las 14:00 Hrs. en las instalaciones del Edificio de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Tabasco, correspondiente a los trabajos de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO", bajo el amparo del contrato No. TAB-SAI-MTTO-001-2020, entregando la empresa MORIELI S.A. DE C.V. a la Subdelegación de Administración e Innovación del inmueble.

Se realiza el recorrido de las Áreas las cuales fueron concluidas y que son requeridas por la subdelegación de Administración e Innovación, con el fin de poder ser integrada al funcionamiento del mismo. Se procede a la entrega-recepción de las siguientes áreas:

- Retiro sin recuperación. Medido previamente. Incluye: limpieza de área, carga y acarreo interior de escombros al banco de obra indicado por el instituto, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo en cualquier nivel de impermeabilizante existente
- Mantenimiento en azotea, incluye; flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, elevación, elaboración, tendido, apisonado, maestreado, nivelado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo

Los principales materiales empleados para el servicio de mantenimiento del edificio de esta delegación son: con mortero cemento-cal-arena en proporción 1:2:9 con espesor de 4 cm. Sellado con lechada de cemento entre otros, de 139.81 m².

Después de que se hizo la revisión física de las Áreas, correspondientes a los trabajos realizados del Edificio de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Materiales, por parte de la Subdelegación de Administración e Innovación, se hace entrega de la misma.

Se le recuerda al contratista que esta Entrega-Recepción Operativa no la exime de su responsabilidad en la solución de defectos y vicios que pudieran surgir al entrar en función estos espacios.

Una vez realizada la revisión de los trabajos concluidos y estando de acuerdo las partes con las condiciones en las que se encuentran, se entrega los trabajos motivo del contrato referentes a "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE


LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO", (fotografías del servicio anexo) siendo las 14:00 hrs. del día 30 de Noviembre de 2020, firmando de común acuerdo las partes involucradas.

ENTREGA:




C. LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA

**RECIBE
POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**



Lic. Liliana Samberino Marín
Subdelegada de Administración e
Innovación.



Lic. Antonio Licona Cruz.
Encargado de mantenimiento de
Edificio
