




**BITACORA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CON NO.TAB SAI MTT0 003 2020 CONSISTENTE EN EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO" CELEBRADO CON LA EMPRESA MORIELI SA DE CV.**

**DIAS 18 DE DICIEMBRE**

SE HACE INICIO DE LABORES EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE EN LA DELEGACION FEDERAL DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEGÚN CONTRATO TAB SAI MTT0 003 2020 DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO.

RECEPCION DEL AREA A TRABAJAR (480.11 MTRS 2), CONSISTIO EN MEDIR, LIMPIAR Y ANALIZAR LA ESTRATEGIA DE TRABAJO.

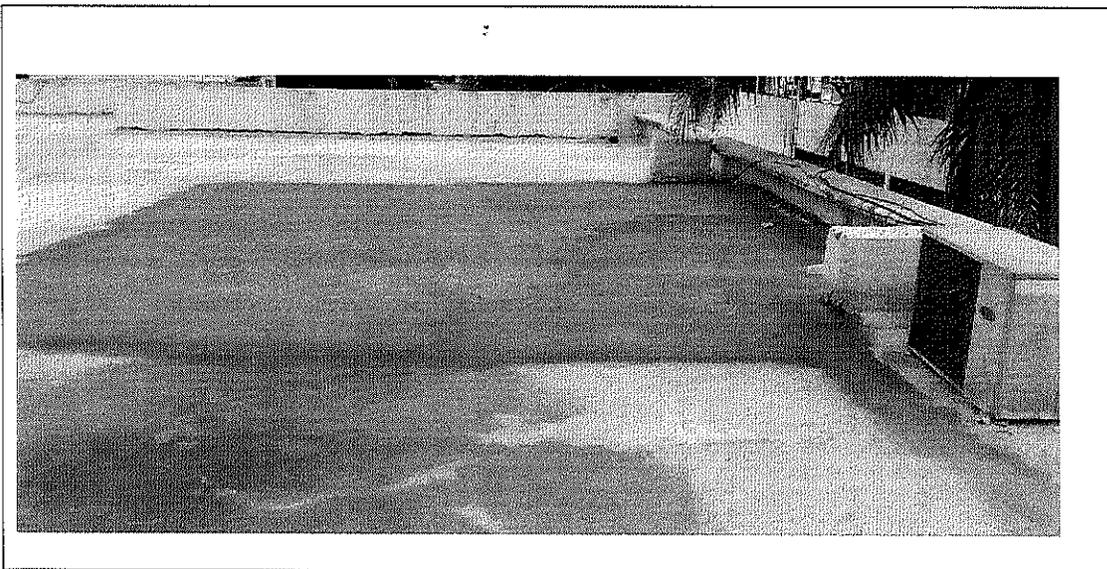


**DIA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE 2020**

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y MEMBRANA.




2



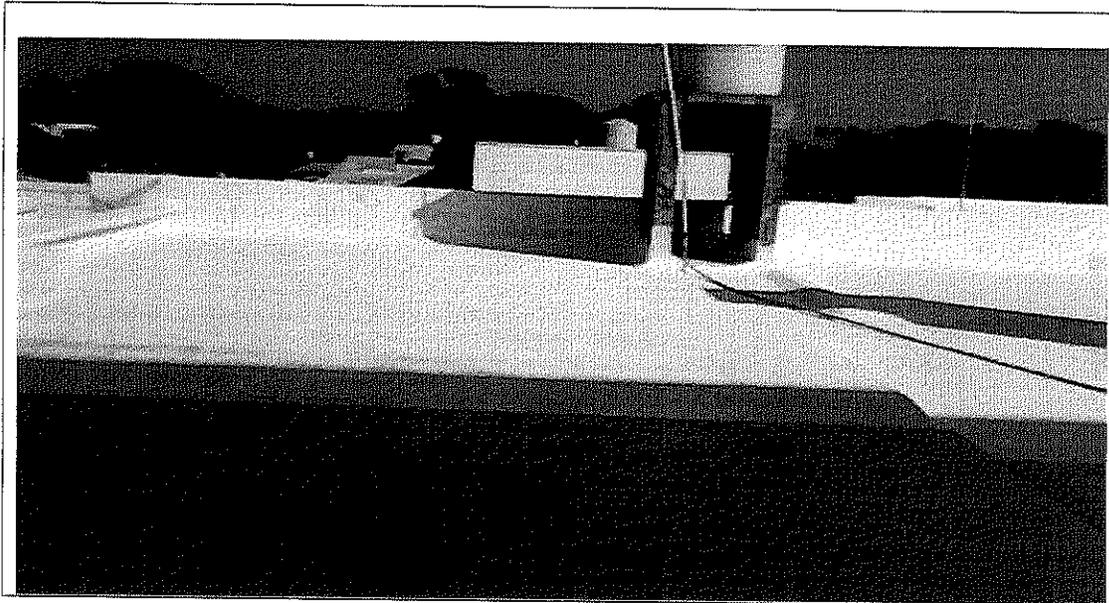


**DIA 24 DE DICIEMBRE**

LIMPIEZA DE SOBRANTES FUERA DE OBRA Y ENTREGA RECEPCION.

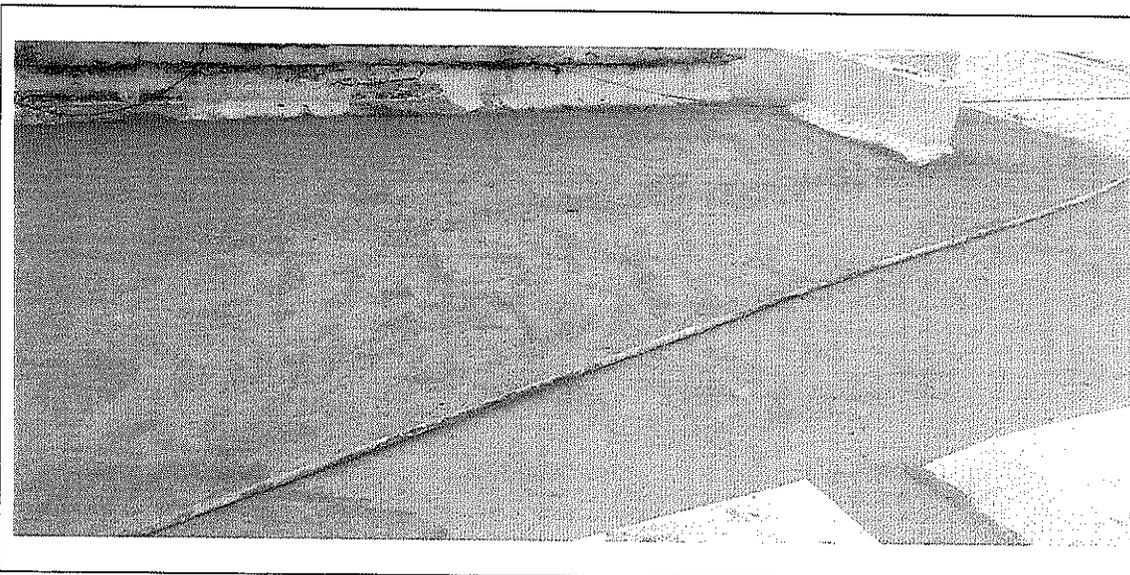

3





Delegación Federal de SEMARNAT  
en el estado de Tabasco  
Subdelegación de Administración  
e Innovación.  
ASUNTO: Finiquito  
OFICIO: SEMARNAT/147/008/2021

Villahermosa, Tabasco a 07 de Enero del 2021.

**C. Luis Enrique Hernández García**  
**Morieli S.A de C.V**  
**Representante Legal**  
**PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. En relación al contrato TAB SAI MTTO 003 2020 de fecha 01 de Diciembre de 2020. Con la empresa **Morieli S.A de C.V.** Por un monto de **\$ 122,524.07** (Ciento veinte dos mil quinientos veinticuatro pesos 07/100 M.N) Para comunicar el cumplimiento conclusión del trabajo de **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO"** en 480.11 m2 de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Tabasco, el contrato de servicios relacionados con obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, se procede a la elaboración del presente finiquito.

Una vez que los trabajos fueron recibidos a entera satisfacción y transcurrido el plazo de cumplimiento del contrato pactado, así mismo el presente sirve para informar que los trabajos fueron entregados por parte del contratista a l Delegación Federal en tabasco SEMARNAT.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**LIC. LILIANA SAMBERINO MARIN**  
**SUBDELEGADA DE ADMINISTRACION E INNOVACION.**

Av. Avenida Paseo de la Sierra No. 613, Colonia Reforma,  
C.P. 86080 Villahermosa, Centro Tabasco,  
Tel. 310 34 03







## ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN OPERATIVA

Acta de **ENTREGA-RECEPCIÓN**, que se lleva a cabo el día 24 de diciembre de 2020 a las 14:00 Hrs. en las instalaciones del Edificio de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Tabasco, correspondiente a los trabajos de "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO", bajo el amparo del contrato No. TAB-SAI-MTTO-003-2020, entregando la empresa MORIELI S.A. DE C.V. a la Subdelegación de Administración e Innovación del inmueble.

Se realiza el recorrido de las Áreas las cuales fueron concluidas y que son requeridas por la subdelegación de Administración e Innovación, con el fin de poder ser integrada al funcionamiento del mismo. Se procede a la entrega-recepción de las siguientes áreas:

- Suministro y aplicación impermeabilizante Elastomérico fibratado Fester Acriton blanco 12 años, incluye: membrana de refuerzo de poliéster, primero Fester Acriton sellador proporción 0.25 lt/m<sup>2</sup>, a dos manos con cepillo y brocha

Los principales materiales empleados para el servicio de mantenimiento del edificio de esta delegación son: membrana de refuerzo de poliéster, primero Fester Acriton sellador proporción 0.25 lt/m<sup>2</sup>, a dos manos con cepillo y brocha, entre otros, de 480.11 m<sup>2</sup>.

Después de que se hizo la revisión física de las Áreas, correspondientes a los trabajos realizados del Edificio de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Materiales, por parte de la Subdelegación de Administración e Innovación, se hace entrega de la misma.

Se le recuerda al contratista que esta Entrega-Recepción Operativa no la exime de su responsabilidad en la solución de defectos y vicios que pudieran surgir al entrar en función estos espacios.


Una vez realizada la revisión de los trabajos concluidos y estando de acuerdo las partes con las condiciones en las que se encuentran, se entrega los trabajos motivo del contrato referentes a "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO", (fotografías del servicio anexo) siendo las 14:00 hrs. del día 24 de Diciembre de 2020, firmando de común acuerdo las partes involucradas.

**ENTREGA:**



**C. LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA**

**RECIBE  
POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

  
**Lic. Liliana Samberino Marín**  
**Subdelegada de Administración e**  
**Innovación.**  
**Lic. Antonio Licóna Cruz.**  
**Encargado de mantenimiento de**  
**Edificio**

**ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIOADOS CON OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NO. TAB-SAI-MTTO-002-2020.**

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas del día **24 de diciembre de 2020**, se reunieron en las Oficinas de la Delegación Federal de la **SEMARNAT** en lo sucesivo "**SECRETARIA**", el **C. Francisco Rivera Hernández**, en su carácter de Encargado de Despacho de la **SEMARNAT** en el Estado de Tabasco, por otra parte la empresa "**Morieli S.A de C.V.**, y en calidad de Responsable de supervisión del servicio el **Lic. Antonio Licona Cruz**, Encargado de Mantenimiento de Edificio, con fundamento en lo establecido en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, así como 168 de su Reglamento, con el objeto de formalizar la recepción de los trabajos ejecutados al amparo del contrato de obra pública, suscrito por la "**SECRETARIA**" y el **Luis Enrique Hernández García**, de conformidad a los siguientes

**HECHOS.**

**PRIMERO.-** Con fecha treinta de octubre de dos mil veinte, la "**SECRETARIA**" y el **C. Luis Enrique Hernández García**, celebraron el contrato de obra pública por el procedimiento de Adjudicación Directa a **TAB-SAI-MTTO-003-2020**, con el objeto de ejecutar los trabajos consistentes en Retiro sin recuperación. Medido previamente. Incluye: Suministro y aplicación impermeabilizante Elastomérico fibratado Fester Acriton blanco 12 años, incluye: membrana de refuerzo de poliéster, primero Fester Acriton sellador proporción 0.25 lt/m<sup>2</sup>, a dos manos con cepillo y brocha con una superficie de 480.11 m<sup>2</sup>, en Delegación Federal de la **SEMARNAT** en el Estado de Tabasco.

**SEGUNDO.-** "**SECRETARIA**" recibe del **C. Luis Enrique Hernández García** los trabajos consistentes en "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO EN 139.81 M2 DE LA DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE TABASCO**", según presupuesto de obra presentado por el contratista, que fue el precio más bajo en el procedimiento realizado en Villahermosa, Tabasco, a entera satisfacción de la **SECRETARIA**.

**TERCERO.-** El monto total del presente contrato, es de **\$ 105,624.20** (Ciento cinco mil seiscientos veinticuatro pesos 20/100 M.N.), más **\$ 16,899.87** (Dieciséis mil ochocientos noventa y nueve pesos 87/100 M.N.) haciendo un total con el Impuesto al Valor Agregado de **\$ 122,524.07** (Ciento veintitrés mil quinientos veinticuatro pesos 07/100 M.N)

**CUARTO.-** "**El Contratista**", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **7 días naturales**, en que se efectuarán los trabajos. El inicio de los trabajos se efectuará el día **18 de diciembre de 2020** y se concluirán a más tardar el día **24 de Diciembre de 2020**, de conformidad con el programa de ejecución pactado.

**QUINTO.-** Las estimaciones o Facturas a la fecha son estimación por un monto total de **\$ 122,524.07** (Ciento veintitrés mil quinientos veinticuatro pesos 07/100 M.N), incluyendo IVA., no quedando ninguna estimación pendiente de autorización

MONTO CONTRATADO: <b>\$ 122,524.07</b>	ANTICIPO OTORGADO: \$0.00
MONTO EJERCIDO: <b>\$ 122,524.07</b>	ANTICIPO AMORTIZADO: \$0.00
MONTO CANCELADO: \$0.00	SALDO ANTICIPADO: \$0.00
AJUSTE DE COSTO: \$0.00	

**SEXTO.-** Las partes declaran que en el presente acto se entregan los trabajos contratados de los bienes instalados.

**SEPTIMO.-** El contratista hace entrega de los trabajos a la Subdelegación de Administración e Innovación, el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos.

**NOVENO.-** Después de un recorrido por la obra, revisados los trabajos y habiéndose constatado su ejecución de acuerdo con las especificaciones generales e indicaciones hechas, los representantes de la SEMARNAT, proceden a la recepción de los trabajos antes descritos.

#### **CIERRE DEL ACTA.**

Una vez cumplido el propósito de la formalización de la presente acta, no habiendo otro asunto que tratar se cierra la misma a las catorce horas del día 24 de Diciembre de dos mil veinte, firmando los asistentes en cas una de sus hojas de conformidad.

**ENTREGA POR LA EMPRESA**



**Luis Enrique Hernández García.**

**Representante Legal.**

AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA										
NO.	NUMERO DE CONTRATO	TIPO DE OBRA	UBICACION DE LA OBRA	OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION	MONTO DEL CONTRATO	MONTO ESTIMADO A LA TERMINACION DE LA OBRA	FECHA DE TERMINACION ORIGINAL DE LOS TRABAJOS	FECHA ESTIMADA DE CONCLUSION DE LOS TRABAJOS	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA OBRA
1	TAB 5A1 MITO 003 2020	CONSERVAR Y MANTENER	TABASCO		\$122,524.07	\$122,524.07	24 de Diciembre de 2020	24 de Diciembre de 2020	100%	100%

FUNDAMENTO: ARTICULO 29 RACION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Lic. Liliara Saabierino Marín

Subdelegada de Administración e Innovación.

Lic. Antonio Licono Cruz

Encargado de mantenimiento de Edificio

