SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR EMILIANO ZAPATA

Unidad administrativa que clasifica: Delegación Federal de la SEMARNAT en Tabasco

Identificación del documento: Informe Anual sobre la Ejecución del Programa de Plantación Forestal Comercial. (SEMARNAT-03-010)

Partes o secciones Clasificadas: *Hoja 1 de 14.*
CURP, RFC, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y DOMICILIO

Fundamento legal y razones: *Por tratarse de datos personales concernientes a una persona física identificada e identificable, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.*

Firma del titular:

"Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 84 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en suplencia por ausencia del Titular de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de Tabasco, previa designación firma el presente la Jefa de Unidad de Gestión Ambiental".

Lic. Liliana Samberino Marín

Fecha de clasificación y número de acta de sesión: Resolución 091/2019/SIPOT de fecha 03 de julio de 2019.

gob.mx

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental
Dirección General de Gestión Forestal y Suelos

Informe anual sobre la ejecución del programa de manejo de plantación forestal comercial SEMARNAT-03-010

Homoclave del formato	Fecha de publicación del formato en el DOF
FF - SEMARNAT - 057	17 | 10 | 2016
1 Lugar de solicitud	2 Fecha de solicitud
VILLAHERMOSA, TABASCO	22 (DD) | 02 (MM) | 2019 (AAAA)

I. Datos generales

3 CURP (personas físicas): [redacted]	Nombre(s):
4 RFC: [redacted]	Primer apellido:
5 RUPA (opcional):	Segundo apellido:
6 Persona física	Nombre(s):
Nombre(s): ENRIQUE	Primer apellido:
Primer apellido: MENDEZ	Segundo apellido:
Segundo apellido: TORRES	10 Domicilio y medios de contacto
7 Persona moral	Código postal: [redacted]
Denominación o razón social:	Calle: [redacted]
	Número exterior: S/N | Número interior: S/N
8 Representante legal (de ser el caso)	Colonia: [redacted]
Nombre(s):	Ciudad o Población: [redacted]
Primer apellido:	Municipio o Delegación: [redacted]
Segundo apellido:	Estado: [redacted]
9 Persona(s) autorizada(s) para oír o recibir notificaciones	Clave Lada: | Teléfono:
Nombre(s):	Extensión: | Teléfono móvil (Opcional): [redacted]
Primer apellido:	Correo electrónico (para recibir notificaciones):
Segundo apellido:	

De conformidad con los Artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

11

II. Datos para recibir notificaciones

(Llenar sólo si los datos son diferentes a los anteriores señalados)

Código postal:			Municipio o Delegación:		
Calle:			Estado:		
Número exterior:	Número interior:		Lada:	Teléfono:	Ext:
Colonia:			Teléfono móvil (Opcional):		
Ciudad o Población:			Correo electrónico (para recibir notificaciones):		

12

III. Datos de información del trámite

Los informes anuales se deberán presentar durante el primer bimestre inmediato siguiente al año que se informe y deberá contener la información de enero a diciembre.
Las plantaciones menores a una hectárea consideradas en el supuesto del quinto transitorio del reglamento de la ley general de desarrollo forestal sustentable, están exentas de la presentación de este informe.
El informe sobre la ejecución del programa de manejo de plantación forestal comercial debe contener la siguiente información:
Cuadro comparativo que deberá contener información entre la especie y superficie plantadas contenidas en el programa de manejo de plantación comercial forestal, con relación a la especie y superficie efectivamente plantadas, así como el porcentaje de avance y las causas de la variación, los volúmenes cosechados por superficie y especie, así como información adicional que el interesado considere conveniente proporcionar.
Al respecto el interesado podrá usar de manera opcional los siguientes cuadros.

Cuadro comparativo entre la especie y superficie plantadas, con relación a la especie y superficie efectivamente plantada, porcentaje de avance y porcentaje de variación.

PROGRAMADO			REALIZADO			
Año	Especie a plantar	Superficie a plantar (ha)	Especie plantada	Superficie plantada (ha)	Avance (%)	Variación (%)
2018	Acacia	20.00	Acacia	10	50	50

Causas de variación:
POR NO CONTAR CON LAS CONDICIONES FAVORABLES EN EL TERRENO PARA LLEVAR A CABO LA PLANTACION Y PROBLEMAS DE INUNDACION EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE.

Contacto:
Av. Progreso N°. 3, Col. Del Carmen,
Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México.
Tel. 01 800 0000 247

Volúmenes cosechados en su caso				
Año	Superficie aprovechada (ha)	Especie	Volumen (m^3)	No. árboles (en su caso)
2018	0.00	NINGUNA	-	-

13	Documentación que se anexa	Sí	No	No aplica (O está en poder de la Secretaría indicar la bitácora)
13.1	Identificación oficial vigente para personas físicas y representantes legales. Original para cotejo y copia simple.	●	○	○
13.2	Acta Constitutiva para el caso de personas morales. Original o copia certificada y copia simple para cotejo.	○	○	●
13.3	Original o copia certificada y copia simple para cotejo del documento con el que se acredita la representación legal del promovente. Para el caso de personas físicas: carta poder firmada ante dos testigos. Para el caso de personas morales: Poder Notarial, sólo en caso de que la representación y las actuaciones para las que se encuentre facultado no se encuentren contenidas desde el Acta Constitutiva.	○	○	●
13.4	Otros (Indicarlos):			

Información adicional
SE PRESENTA DE MANERA ANEXA EL INFORME DE ACTIVIDADES.

Contacto:
Av. Progreso N°. 3, Col. Del Carmen,
Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México.
Tel. 01 800 0000 247

ENRIQUE MENDEZ TORRES	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 29 ABR. 2019 RECIBIDO VENTANILLA UNICA DELEGACION FEDERAL EN TABASCO
14 Nombre y firma del titular de la plantación o representante legal	15 Nombre, firma de quien recibe, fecha y sello de acuse

Los datos personales recabados para la atención de su trámite serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema Nacional de Trámites de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en el Artículo 15 de la LFPA y 4, fracción II, inciso a) del Acuerdo por el que se crea y establecen las bases de funcionamiento del Sistema Nacional de Trámites de la SEMARNAT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2005. Lo anterior se informa en cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005.

Contacto:
Av. Progreso N°. 3, Col. Del Carmen,
Coyoacán, C.P. 04100, Ciudad de México.
Tel. 01 800 0000 247

INFORME ANUAL
ACTIVIDADES REALIZADAS 2018

PREDIO "DZEMUL"

[redacted]

PRESENTA: ENRIQUE MENDEZ TORRES

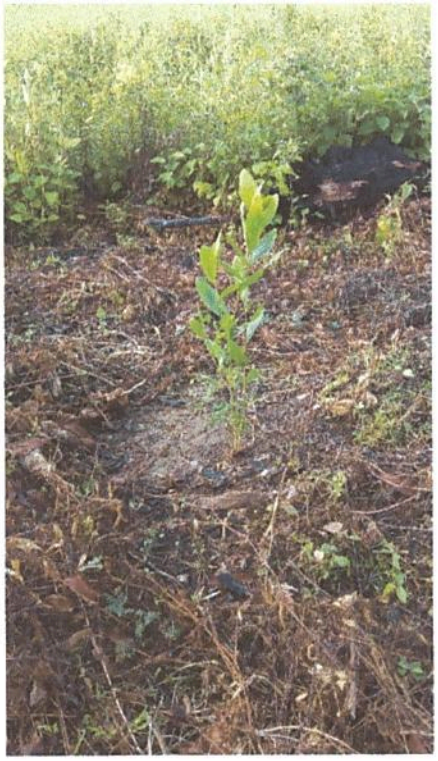

VILLAHERMOSA, TABASCO; FEBRERO 2019

ANTECEDENTES

A finales del año 2017, se inició elaborar el programa de manejo forestal para Plantaciones Forestales Comerciales, durante el mes de diciembre del mismo año ingrese el trámite ante la SEMARNAT, misma que se autorizó mediante oficio No. SEMARNAT/SGPARN/147/0140/2018, BITACORA: 27/BL-0080/01/18, con código de identificación F-27-012-DZE-001/18, de fecha 19 de enero de 2018, donde me otorgaron la Constancia de Registro de Plantación Forestal Comercial, para el predio denominado "El Dzemul".

Predio	Especie	Superficie (Ha)	Plantas por ha
Dzemul	Acacia (***Acacia mangium***)	20.00	1,111

Con base a las obligaciones conferidas en el oficio antes citado, en este documento presento el informe anual de las actividades realizadas durante el año 2018.

UBICACIÓN DEL PREDIO.

El predio denominado **"El Dzemul"**, se ubica en el municipio Municipio de Macuspana, Tabasco. Coordenadas de referencia del predio: [redacted]

ACTIVIDADES REALIZADAS

Con el propósito de llevar a cabo el establecimiento de plantaciones con la especie de **Acacia (*Acacia magium*)**, se procedió a realizar la compra de la semilla, para asegurar en tiempo y forma el abasto de las plantas a ocupar.

Aproximadamente se invirtieron $60,000.00 pesos en semillas de Acacia, para comprar 12 kg, los cuales fueron trabajados en diferentes temporadas a lo largo del año.

En el año 2018, se realizaron las siguientes actividades:

1.- Limpieza del área a plantar.

Desde el mes de abril se dio inicio con la limpieza del terreno, realizándolo primeramente de manera manual y en algunos lugares mecanizada.

Corte de maleza y arbustos. Mediante el uso de machetes, motosierra y posteriormente por quema fue posible despejar las 20 hectáreas que se trabajarán en el proyecto.

2.- Trazado.

En el mes de mayo, se inició con el diseño del trazo, esto para orientar el marco de plantación (principalmente las líneas de plantación), y facilitar la apertura de cepas y/o la siembra de las semillas. Se realizó la roturación del suelo en las líneas de plantación, con el propósito de descompactar el suelo.

3.- Aplicación de herbicida.

Antes de llevar a cabo el establecimiento, se aplicó herbicida de tipo glifosato.

Fumigado con herbicida tipo glifosato.

4.- Siembra.

En el mes de junio se inició con la siembra directa de la semilla, a una densidad de 1.5 metros por 1.5 metros. A principios del mes de julio se observaron que ya estaban germinando las semillas de acacia.

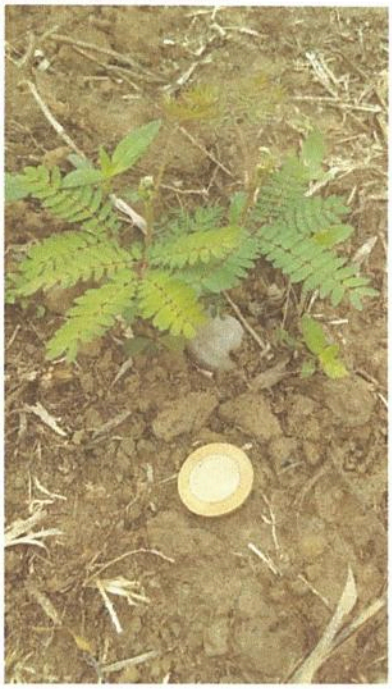

5.- Control de maleza.

Por cuestiones de salud, hasta finales de septiembre, procedimos a realizar el control de malezas, para revisar la sobrevivencia de las plantas y poder programar la reposición de las plantas muertas. La sorpresa fue, que mucha planta germinada, no había sobrevivido, observando que en el área había huellas de que se había acumulado agua, dado a que, en el predio vecino, iniciaron con una plantación de plátano y realizaron drenes de desagüe, pensando que esto afecto mi parcela ya que se mantuvo el agua mayor tiempo, y no hubo drenaje, motivo por el cual la mayoría de las plantas perecieron.

Anegación del terreno sembrado, inclusive en la zona alta del mismo.

Encharcamiento puntualizado y persistente en las zanjas resultantes del arado.

6.- Producción de plantas.

En el mes de octubre se compró semilla de acacia, e iniciamos la producción de plantas para realizar la reposición de plantas muertas.

Sembrado de semillas en charolas de germinación.

Sembrado de semillas bajo la protección de malla sombra.

7.- Reposición.

En el mes de enero de 2019, se inició con la reposición de plantas, cubriendo una superficie de 10 hectáreas.

Germinación de semillas sembradas en áreas protegidas.

Algunas plantas que han sobrevivido el proceso de siembra.

8.- Labores de prevención y control de incendios.

Durante el año 2018, no hubo presencia de incendios, pero se realizaron limpieza en el perímetro de la plantación.

8.- Podas y aclareos.

Derivado que la plantación es reciente, a la fecha no se han llevado a cabo actividades de podas y/o aclareos.

ATENTAMENTE

Enrique Méndez Torres

Anexo Fotográfico

Rehabilitación de cerco perimetral

Limpieza del area

Preparación mecanizada (Subsuelo)

Siembra directa

Germinación

Seguimiento y monitoreo
